

Základní informace pro účastníky exkurze stavby:

Odstavy tramvají – ul. Jeremenkova

Základní údaje ke stavbě:

Investor: Dopravní podnik města Olomouce a.s.
Projektant: SUDOP BRNO spol. s r.o.,
Zhotovitel: OHLA ŽS a.s. , vedoucí projektu – Petr Jonáš
Cena stavby: 324,9 mil. Kč bez DPH, vč. dodatků
Zahájení výstavby: 8.9.2021
Dokončení díla: 30.6.2023



Základní informace:

Stručný popis konstrukčního řešení:

Ocelová konstrukce haly objektu SO 701 o hmotnosti	254,901 t
ŽB monolitické konstrukce SO 701, SO 702 a SO 004 o kubatuře	2.687 m ³
Servisní jámy s automatickými roletami 3 x cca 100 metrů běžných	
Střecha ze sendvičových panelů	1634 m ²
Opláštění ze sendvičových panelů	1802 m ²
Obslužné asfaltové komunikace	



Rekonstrukce tramvajová dráhy od hlavního nádraží po nově vsazené výhybky, napojení na halu odstavů a tři koleje v hale samotné
Záruční doba je 60 měsíců.

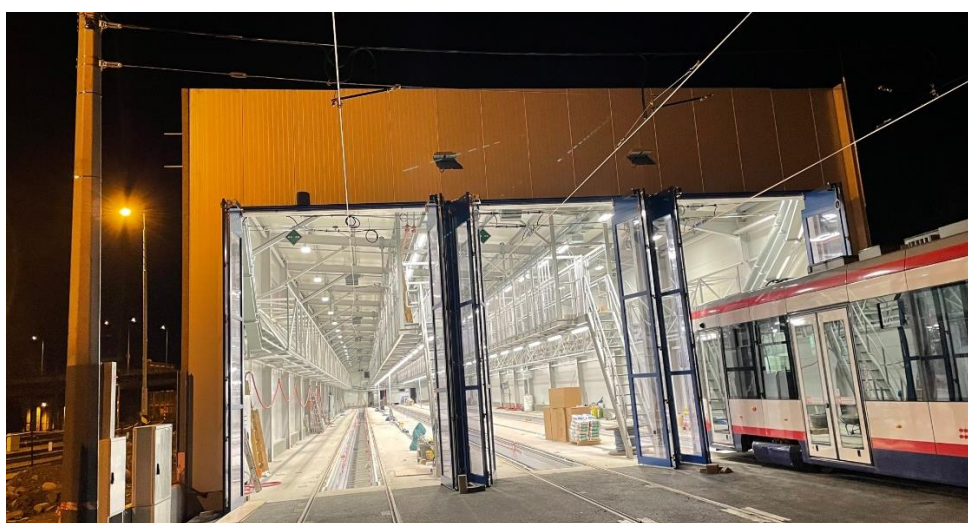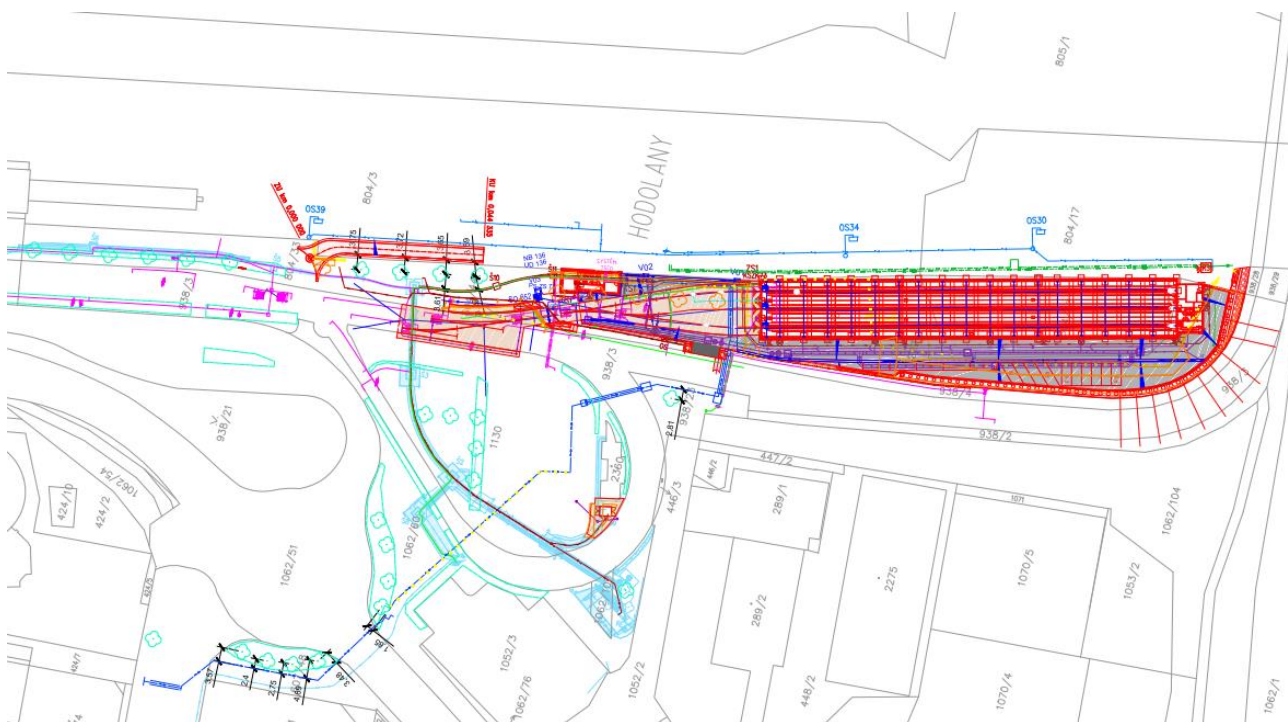

Poznámka:

Na základě podkladů předaných firmou OHLA ŽS, a.s., připravil: Jiří Kožušníček
